Avance del sistema

Sistema de turnos y gestión de Abundia · actualizado al 26/10/2026

Avance general
56 %

Tareas terminadas
12 de 32

Ahora estamos con
Usuarios y permisos · Página pública de turnos (link para clientas) · Guía de uso y capacitación


Turnos funcionando (estimado)
10/11/2026
Sistema completo: 28/11/2026

Lo que necesitamos de ustedes


El sistema ya se puede probar. Con estas respuestas completamos la carga y abrimos la página a las clientas:

- Precio y duración de cada servicio (prometido para hoy a la tarde): sin precio el servicio no aparece en la página.
- Detalle y breve reseña de cada servicio, para la página.
- Quién hace masajes y Mío Up (hoy quedaron con Vanesa).
- Reprogramación: ¿24 o 48 h? ¿El plazo es para elegir el día nuevo? Si anula el turno reprogramado, ¿pierde la seña?
- Lista de clientas de confianza (turno sin seña desde gestión).
- WhatsApp del centro y banco de la cuenta de señas (los pasa Vane).
- Packs de Mío Up: precio del de 8 sesiones y vencimiento.
- Productos para el catálogo, con precio y foto.
- Dirección, Instagram y redes para la página.

Gráfico de tiempos (Gantt)

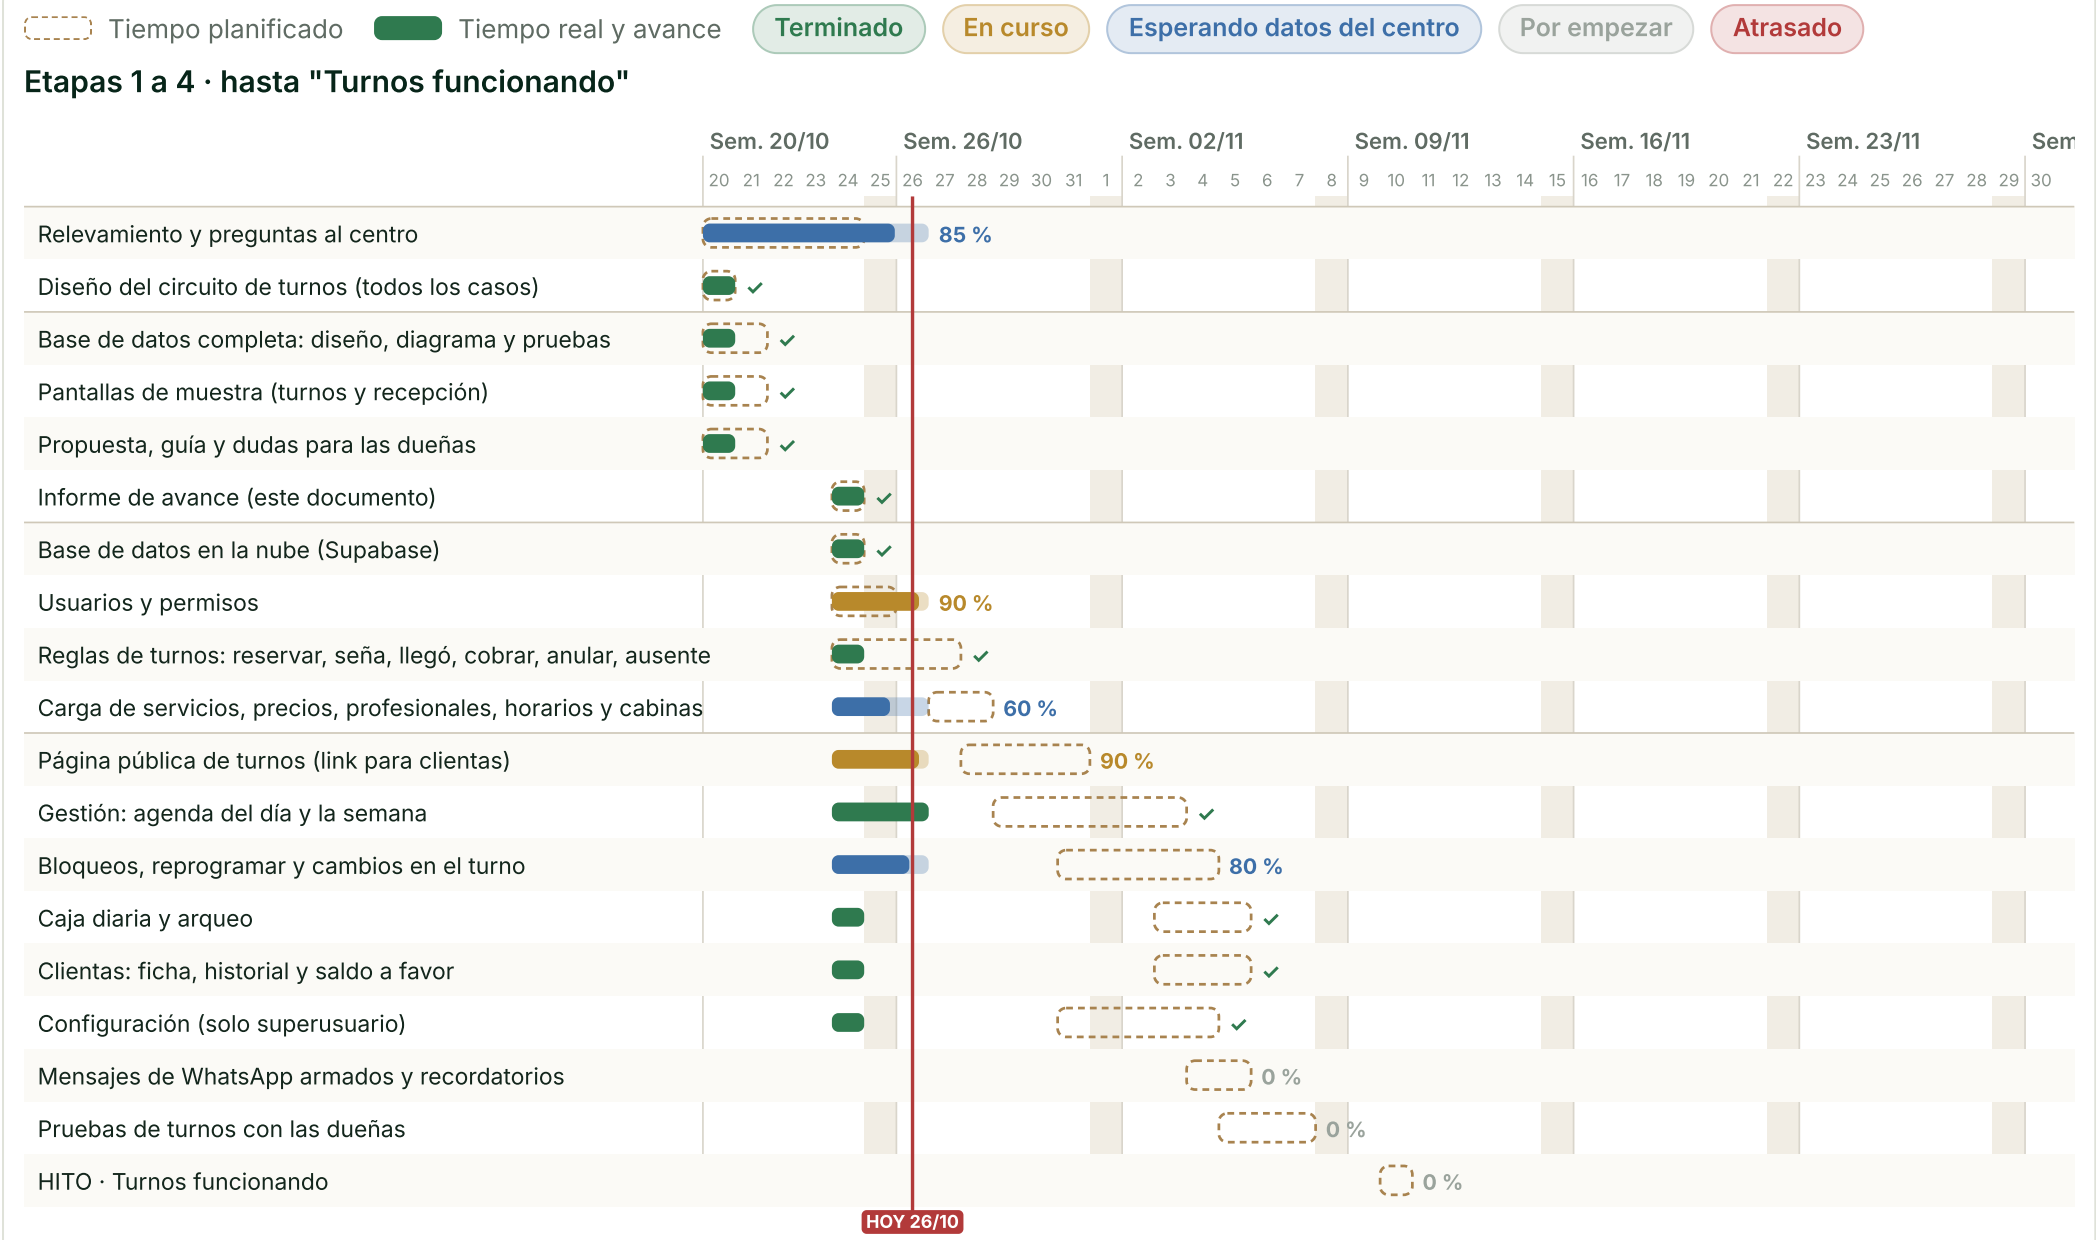

Etapas 5 y 6 · gestión completa

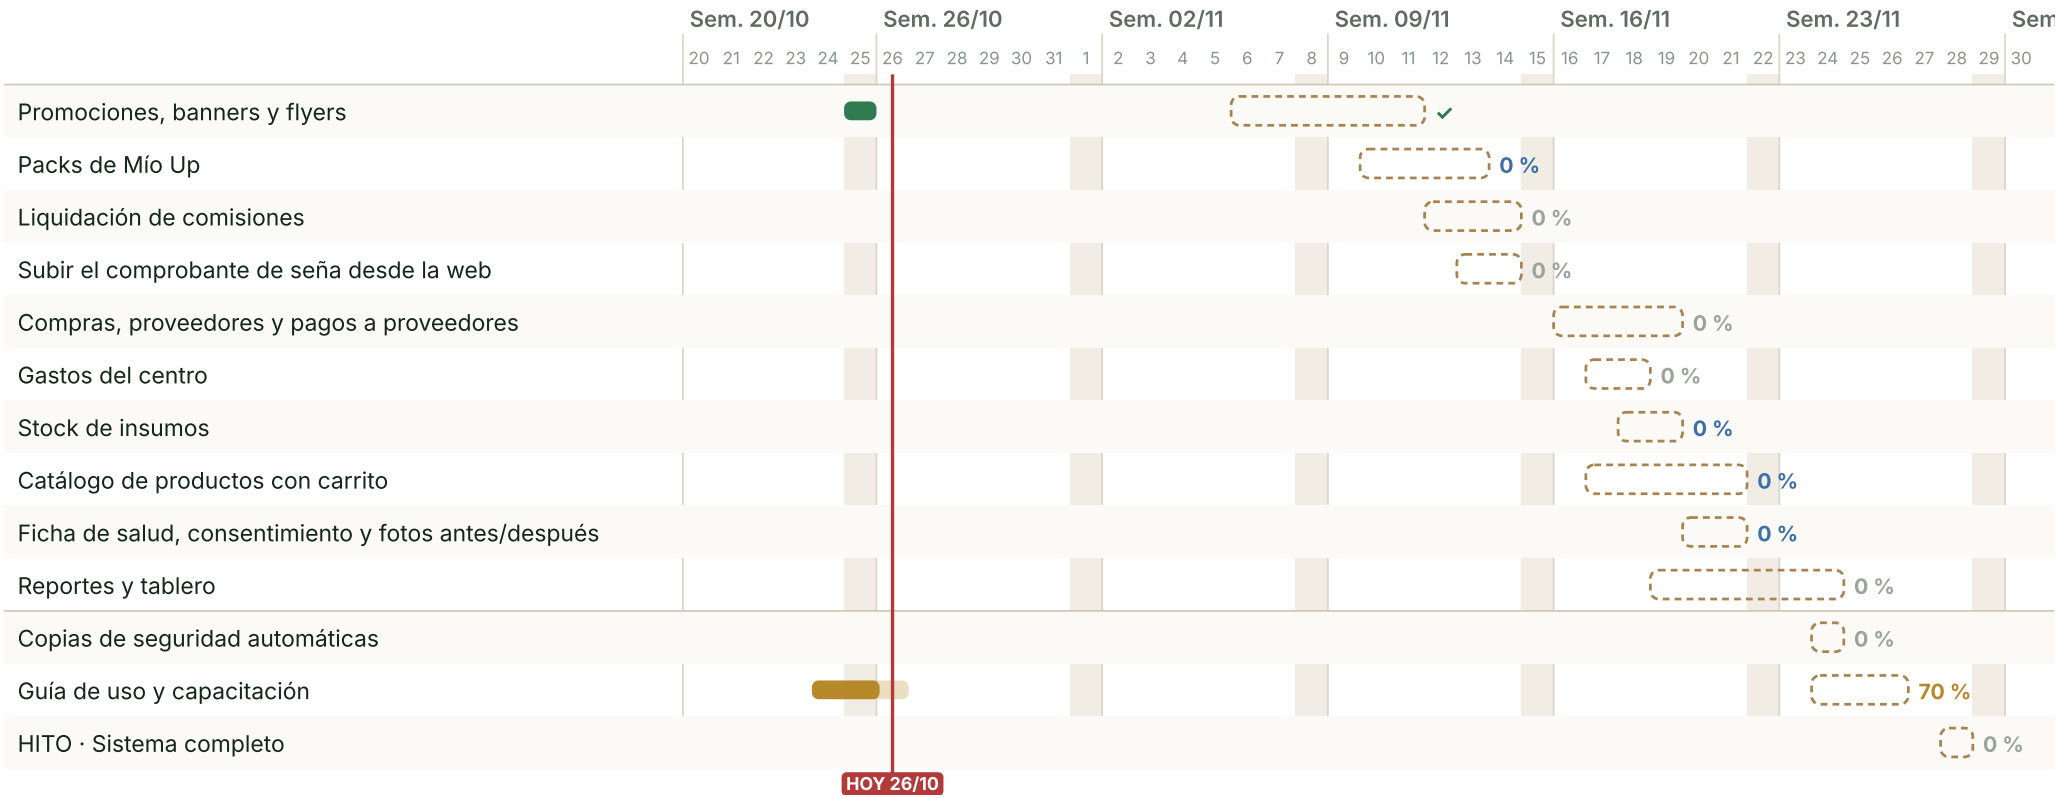

Cada fila muestra el tiempo planificado (contorno punteado) y el real (barra de color, lo pintado fuerte es el avance). La línea roja es hoy. Las fechas planificadas son estimadas y se ajustan cuando llegan los datos del centro.

Detalle de cada tarea

ETAPA	TAREA	PLANIFICADO	REAL	ESTADO	AVANCE
1. Relevamiento	**Relevamiento y preguntas al centro** Contestaron el 24/10 y el 26/10. Faltan precios, detalle de servicios y algunas reglas (ver abajo).	20/10 → 24/10	20/10 → sigue	Esperando datos del centro	85 %
1. Relevamiento	**Diseño del circuito de turnos (todos los casos)** Seña, plazo, anulación, tolerancia, llegada, cobro, reprogramar, falta de profesional.	20/10 → 20/10	20/10 → 20/10	Terminado	100 %
2. Diseño	**Base de datos completa: diseño, diagrama y pruebas** Turnos, clientas, caja, cobros, compras, proveedores, pagos, gastos, stock, packs, comisiones, ficha. 146 pruebas aprobadas.	20/10 → 21/10	20/10 → 20/10	Terminado	100 %
2. Diseño	**Pantallas de muestra (turnos y recepción)** Publicadas en la web. Datos de ejemplo.	20/10 → 21/10	20/10 → 20/10	Terminado	100 %
2. Diseño	**Propuesta, guía y dudas para las dueñas** 28 dudas para responder por WhatsApp.	20/10 → 21/10	20/10 → 20/10	Terminado	100 %
2. Diseño	**Informe de avance (este documento)** Se actualiza en cada avance.	24/10 → 24/10	24/10 → 24/10	Terminado	100 %
3. Sistema real	**Base de datos en la nube (Supabase)** Subida y verificada igual a la probada.	24/10 → 24/10	24/10 → 24/10	Terminado	100 %

ETAPA	TAREA	PLANIFICADO	REAL	ESTADO	AVANCE
3. Sistema real	**Usuarios y permisos** Superusuario y dos administradoras creados y probados. Contraseñas de prueba: cambiarlas antes de abrir a clientas reales.	24/10 → 25/10	24/10 → sigue	En curso	90 %
3. Sistema real	**Reglas de turnos: reservar, seña, llegó, cobrar, anular, ausente** Seña 30 %, 15 min para pagar, 24 h para anular, 10 min de tolerancia, seña a favor. 277 pruebas + prueba en la base real.	24/10 → 27/10	24/10 → 24/10	Terminado	100 %
3. Sistema real	**Carga de servicios, precios, profesionales, horarios y cabinas** Cargado: horario, Cabina 1 (compartida), Vanesa y Luciana con sus servicios y horarios, preparación 10/20 min, 3 h de anticipación, Mío Up con precio. Falta precio y duración de los otros 19 servicios: sin precio no aparecen en la página.	27/10 → 28/10	24/10 → sigue	Esperando datos del centro	60 %
4. Turnos funcionando	**Página pública de turnos (link para clientas)** Publicada y probada en vivo: elige servicio, zonas, profesional y horario, paga seña, ve y anula su turno. Falta el WhatsApp del centro.	28/10 → 31/10	24/10 → sigue	En curso	90 %
4. Turnos funcionando	**Gestión: agenda del día y la semana** Publicada y probada: agenda del día y de la semana (lunes a domingo, colores por profesional, tocar un turno abre su día), turno por teléfono, seña, llegó, cobro.	29/10 → 03/11	24/10 → 26/10	Terminado	100 %

ETAPA	TAREA	PLANIFICADO	REAL	ESTADO	AVANCE
4. Turnos funcionando	**Bloqueos, reprogramar y cambios en el turno** Probado en vivo: bloqueos y feriados, reprogramar, cancelar, no vino y deshacer. Falta la regla nueva de reprogramación (una sola vez, con plazo): esperando que el centro aclare 24 o 48 h.	31/10 → 04/11	24/10 → sigue	Esperando datos del centro	80 %
4. Turnos funcionando	**Caja diaria y arqueo** Probado en vivo: abrir y cerrar varias veces por día, cobro mixto, arqueo que obliga a contar y registra diferencias.	03/11 → 05/11	24/10 → 24/10	Terminado	100 %
4. Turnos funcionando	**Clientas: ficha, historial y saldo a favor** Probado en vivo: buscar, ficha con turnos, ausencias y seña a favor que se descuenta sola en el próximo cobro.	03/11 → 05/11	24/10 → 24/10	Terminado	100 %
4. Turnos funcionando	**Configuración (solo superusuario)** Datos del centro, reglas de turnos, medios de pago, cuentas y usuarios.	31/10 → 04/11	24/10 → 24/10	Terminado	100 %
4. Turnos funcionando	**Mensajes de WhatsApp armados y recordatorios** Confirmación, aviso de seña, recordatorio del día anterior. Se envían a mano.	04/11 → 05/11	— → —	Por empezar	0 %
4. Turnos funcionando	**Pruebas de turnos con las dueñas** Turnos reales con acompañamiento; se ajusta lo que haga falta.	05/11 → 07/11	— → —	Por empezar	0 %
4. Turnos funcionando	**HITO · Turnos funcionando** Las clientas ya piden turno por la página.	10/11 → 10/11	— → —	Por empezar	0 %

ETAPA	TAREA	PLANIFICADO	REAL	ESTADO	AVANCE
5. Gestión completa	**Promociones, banners y flyers** Terminado y probado en vivo: ellas arman promos o suben flyers, eligen color y fechas, ven cómo queda, y salen solas en la página con botón Reservar.	06/11 → 11/11	25/10 → 25/10	Terminado	100 %
5. Gestión completa	**Packs de Mío Up** Venta del pack y descuento de sesiones. Falta confirmar precios y vencimiento.	10/11 → 13/11	— → —	Esperando datos del centro	0 %
5. Gestión completa	**Liquidación de comisiones** 30 % en manicuría; liquidación por período y pago como gasto.	12/11 → 14/11	— → —	Por empezar	0 %
5. Gestión completa	**Subir el comprobante de seña desde la web** La clienta sube la foto de la transferencia; ellas la aprueban.	13/11 → 14/11	— → —	Por empezar	0 %
5. Gestión completa	**Compras, proveedores y pagos a proveedores** Facturas de compra, cuenta corriente con cada proveedor, pagos.	16/11 → 19/11	— → —	Por empezar	0 %
5. Gestión completa	**Gastos del centro** Alquiler, servicios, insumos, sueldos, por tipo y concepto.	17/11 → 18/11	— → —	Por empezar	0 %
5. Gestión completa	**Stock de insumos** Descuento de insumos por servicio. Falta saber si lo quieren (pregunta 24).	18/11 → 19/11	— → —	Esperando datos del centro	0 %

ETAPA	TAREA	PLANIFICADO	REAL	ESTADO	AVANCE
5. Gestión completa	**Catálogo de productos con carrito** Como Pirotecnia Boom. Falta la lista de productos con precio y foto (23).	17/11 → 21/11	— → —	Esperando datos del centro	0 %
5. Gestión completa	**Ficha de salud, consentimiento y fotos antes/después** Falta saber qué datos quieren en la ficha (25).	20/11 → 21/11	— → —	Esperando datos del centro	0 %
5. Gestión completa	**Reportes y tablero** Ventas, servicios más pedidos, ocupación, ausencias, señas perdidas, resultado del mes.	19/11 → 24/11	— → —	Por empezar	0 %
6. Cierre	**Copias de seguridad automáticas** Respaldo diario de la base.	24/11 → 24/11	— → —	Por empezar	0 %
6. Cierre	**Guía de uso y capacitación** Manual interactivo publicado (15 lecciones, 141 pasos con la pantalla marcada) y botón Ayuda en el sistema. Falta la práctica con las dueñas.	24/11 → 26/11	24/10 → sigue	En curso	70 %
6. Cierre	**HITO · Sistema completo** Todo el sistema de gestión funcionando.	28/11 → 28/11	— → —	Por empezar	0 %

Paso a paso, desde el inicio

20/10	**Arranque** Se tomó como base el sistema de Pirotecnia Boom (ya probado en uso real) y se definió que lo principal es la página de turnos.
20/10	**Circuito de turnos** Se definió cómo se pide un turno, la seña por transferencia, el plazo para pagarla, la anulación, la tolerancia de 10 minutos, el "Llegó" y que el turno termina al cobrar.
20/10	**Base de datos** Se diseñó la base completa (turnos, servicios, profesionales, cabinas, packs, comisiones, ficha de la clienta) y se probó con 146 pruebas automáticas.
20/10	**Pantallas de muestra** Se armaron la página de turnos para clientas y la agenda de recepción, con los colores y el logo de Abundia, para que las vean.
20/10	**Propuesta y dudas** Se armó la propuesta con las 28 dudas, para contestar desde el celular y mandar por WhatsApp.
24/10	**Respuestas del centro** Vanesa contestó: seña 30 %, 15 minutos para pagar, anular hasta 24 h antes, servicios simultáneos, la clienta elige profesional, 30 % de comisión en manicuría, packs de Mío Up.
24/10	**Base en la nube** Se contrató el plan Pro de Supabase y se subió la base. Se comparó contra la versión probada: es igual.
24/10	**Usuarios** Se definieron los usuarios: un superusuario (soporte) y Vanesa y Luciana como administradoras, con todo menos la configuración.
24/10	**Informe de avance** Se armó este informe con el Gantt de todo lo relevado.
24/10	**Reglas de turnos** Se programaron todas las reglas con las respuestas de Vanesa y se probaron (277 pruebas automáticas). Recién después se subieron a la nube.
24/10	**Prueba completa en vivo** Se probó gestión botón por botón contra la base real. Se encontraron y corrigieron: caja una sola vez por día, arqueo sin contar, reprogramar, pantallas que se corrían en el celular.
24/10	**Manual interactivo** Se publicó el manual con lecciones guiadas paso a paso y el botón Ayuda dentro del sistema.
25/10	**Promociones, banners y flyers**

	Ahora las chicas arman promociones o suben flyers y aparecen solas en la página de turnos, con fechas y botón Reservar.
26/10	**Segundas respuestas del centro** Se cargaron Luciana (pestañas, cejas y facial, de 16 a 21) y los servicios de Vanesa, la preparación de 10 o 20 minutos según el servicio y 3 horas de anticipación para reservar.
26/10	**Agenda de la semana** En la Agenda se puede ver la semana entera, con un color por profesional. Tocando un turno se abre su día para trabajarlo.
24/10	**Primera versión para probar** Se publicaron la página de turnos para clientas y la de gestión. Se cargaron los datos que ya tenemos y se hizo una reserva real de prueba, que después se anuló.

Fuera de alcance por ahora

- Factura electrónica: Abundia no factura; los comprobantes del sistema dicen "no válido como factura". Se puede sumar más adelante.
- Envío automático de WhatsApp: el centro prefiere hacerlo a mano (la API cobra por mensaje). El sistema arma el mensaje y abre WhatsApp.
- Usuarios para recepción y profesionales: hoy usan el sistema solo las dueñas. La base ya lo permite si después lo quieren.

Para ver

- Pedir turno (clientas) https://ema-data-analytics.github.io/abundia/reservar.html
- Gestión (para ustedes) https://ema-data-analytics.github.io/abundia/gestion.html
- Manual (Ayuda) https://ema-data-analytics.github.io/abundia/manual.html
- Propuesta y dudas https://ema-data-analytics.github.io/abundia/
- Página de turnos (muestra) https://ema-data-analytics.github.io/abundia/turnos.html
- Agenda de recepción (muestra) https://ema-data-analytics.github.io/abundia/recepcion.html
- Guía de uso https://ema-data-analytics.github.io/abundia/guia.html

Las pantallas de muestra usan datos de ejemplo; todavía no están conectadas al sistema real.
